


山形市立商業高等学校校舎等改築事業NEWS Vol.6

【発行】

2020（令和2）年12月
株式会社山商パートナーズ
連絡先(山形建設本社)：(023)644-5208

工事経過の報告

4月より建築工事を開始し、校舎棟を1～6工区、体育館棟をA～D工区に分け工事を行ってきました。初めに基礎工事及び1階床工事を行い、その後1階躯体工事、2階躯体工事の順に工区ごと進んでいます。躯体工事とは、建物の主要な構造体を作る工事で、建築工事において非常に重要な工程です。躯体工事の各工区のスケジュールは下表の通りです。建築工事の進捗率は、11月30日時点で34.5%となっています。

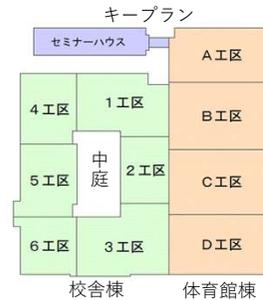

各工区の躯体工事スケジュール


| | 令和2年12月 | | | 令和3年1月 | | | 令和3年2月 | | | 令和3年3月 | | |
|---|---------|----|----|--------|----|----|--------|----|----|--------|----|----|
| | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 28 | 10 | 20 | 31 |
| 1 | [1階躯体] | | | [2階躯体] | | | [3階躯体] | | | | | |
| 2 | [1階躯体] | | | [2階躯体] | | | [3階躯体] | | | | | |
| 3 | [1階躯体] | | | [2階躯体] | | | [3階躯体] | | | | | |
| 4 | [1階躯体] | | | [2階躯体] | | | [3階躯体] | | | | | |
| 5 | [1階躯体] | | | [2階躯体] | | | [3階躯体] | | | | | |
| 6 | [1階躯体] | | | [2階躯体] | | | [3階躯体] | | | | | |
| A | [1階躯体] | | | [2階躯体] | | | [3階躯体] | | | | | |
| B | [1階躯体] | | | [2階躯体] | | | [3階躯体] | | | | | |
| C | [1階躯体] | | | [2階躯体] | | | [3階躯体] | | | | | |
| D | [1階躯体] | | | [2階躯体] | | | [3階躯体] | | | | | |

■1階躯体工事 ■2階躯体工事 ■3階躯体工事

校舎棟（1～6工区）




校舎棟全景 8月7日撮影

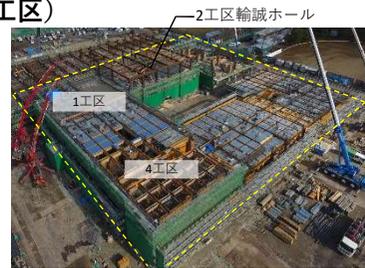

校舎棟全景 12月9日撮影

上記の写真は、8月7日の基礎工事中と12月9日の各階躯体工事中の校舎棟の写真です。1工区は2階の躯体工事を行っています。（コンクリート打設中）

2工区は、輸誠ホール部分の工事中です。ホール後方座席の傾斜した床をコンクリートでつくる準備をしています。このホールは、多様な活動に対応し、日常的に学習や発表、主体的な学習空間として利用できるようになります。



1工区コンクリート打設風景 12月9日撮影



2工区(輸誠ホール部分) 12月2日撮影
パースイメージと逆側から撮影




輸誠ホール完成イメージ

体育館棟（A～D工区）



体育館棟全景 8月7日撮影



体育館棟全景 12月9日撮影



D工区 雨天練習場部分床 12月2日撮影

体育館棟は現在1階の躯体工事がメインとなっており、順次上部へと進んでいきます。上記の写真は、8月7日の基礎工事中と12月9日の状況です。D工区ではこれから床工事が行われます。最終的には全面人工芝の雨天練習場となります。

現場見学会開催



10月23日に新庄神室産業高校、11月11日に山形工業高校の生徒それぞれ約40名が現場見学会を行いました。両校とも建築を学んでいる生徒で、熱心にメモを取りながら見学していました。写真は、神室産業高校の現場見学会の写真です。現場担当者が説明をしながら現場をまわり、生徒は積極的に質問をしていました。
