

～4月から建築工事が始まります～

①仮設工事の進捗

- 仮設工事が3月に完了しました。公園と工事エリアの境界は安全に配慮すると共に、区画を明確にする為に仮囲いを設置しました。公園利用の際は十分注意してご使用下さい。
- あかねヶ丘公園トイレの移設が完了しました。公園北側より利用でき、4月1日より供用開始しております。
(多目的トイレのみ。移設位置は下図参照。)
- 4月より建築工事を開始します。近隣住民の皆様、公園利用の方々にご迷惑をお掛けしない様に施工して参ります。



公園・工事エリア境界（仮囲いで区画）



あかねヶ丘公園トイレ（移設後）

②4月の工事予定

- 遣り方(建物の位置決め)を13日から18日まで行う予定です。
- 杭芯出しを13日から18日まで、杭打機搬入及び組立を23日から行います。
- 本格的な杭工事は5月に入ってから行います。


〈4月工事予定〉

月		4																															
日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
工事内容	遣り方 (位置決め)																																
	杭工事																																

③建築工事のお知らせ

- 敷地南側の3か所を工事車両の出入口とします。
- 作業時間は月曜日から土曜日の午前8時から午後5時までとします。
(作業途中で中断不可能な作業等については時間外に実施する場合がございます。)
- 日曜日は原則休業とします。
(急を要する安全対策等行う場合あり)
- 資材の搬出入は、地域住民の皆様、生徒・学校関係者の安全な通行を最優先して行います。
- 安全確保のために適切にガードマンを配置し誘導、監視を行います。
- 現場周辺道路には工事関係車両は待機しないようにします。
- 詳細は右記図面を参照して下さい。

〈工事車両搬出入経路 仮設図〉

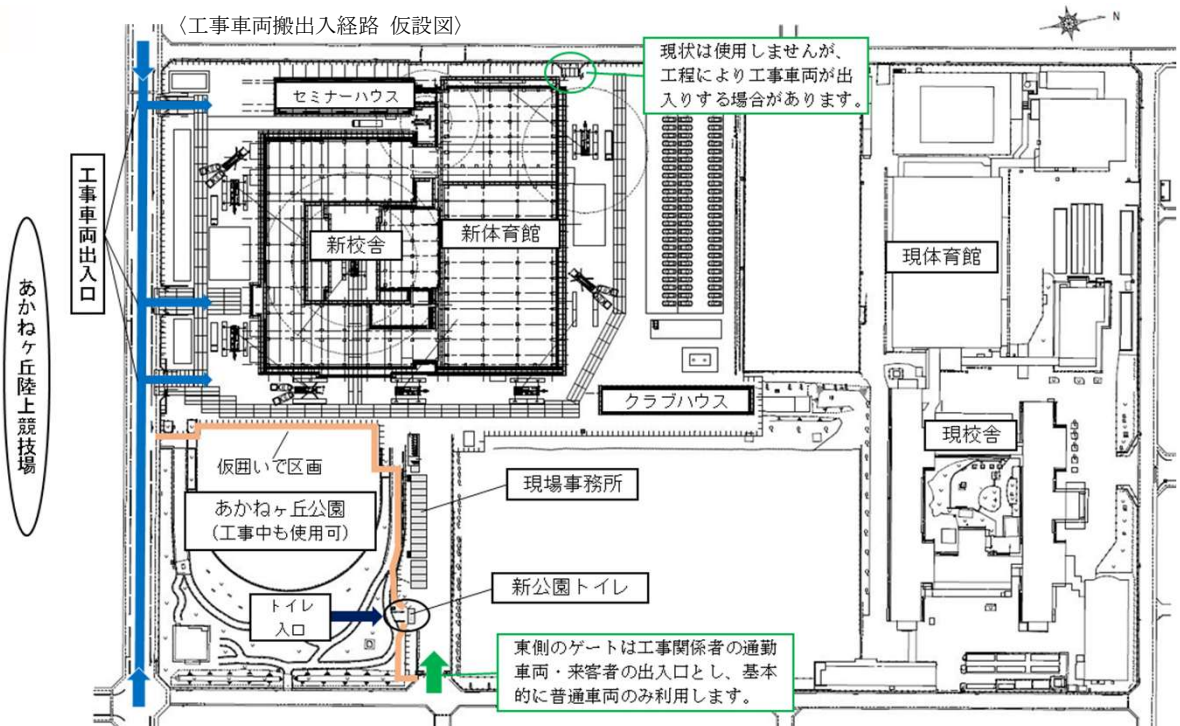

施工者	山形建設・市村工務店・千歳建設特定建設工事共同企業体	
工事期間	(着工) 令和2年4月1日	(完成) 令和3年3月31日
連絡先	現場代理人 小野活人	023-644-5208
